

DATOS ODT

Nro Orden : 7028259
Numero Acta : 73441
Código Interno : 375792
Revisión Previa : SI
INICIO ORDEN TRABAJO
Fecha Ejecución : 21-06-2019 15:26:59

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA
Nombre Suscriptor : NICEFORA QUINONES DE M
Dirección : CL COMERVIO CS 326 - CL COMERCIO - TUMACO
Municipio : TUMACO
Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA
Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL
Tipo De Uso Corresponde : SI
Que Funciona Actualmente? : vivienda

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI
Medida Reactiva : SI
No. Medidor : 047420299
Sticker Encontrado : 176421
Marca : ZIV
Año : 2016
Tipo : 5CTM-E2C-4D536A
Clase : 1
Lectura Activa (kWh) : 003425
Lectura Reactiva (kVARh) : 00922
Tipo Medidor : MONOFASICO
Tensión : 120
Corriente : 0.25-5(80)
Medida Inteligente : SI
Sello 1 Tapa Principal : 263201
Tipo Sello 1 Tapa Principal : AZ
Color1 Tapa Principal : AZUL
Sello 2 Tapa Principal : 263202
Tipo Sello 2 Tapa Principal : AZ
Color2 Tapa Principal : AZUL
Sello 1 Tapa Bornera : 1606482
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL
Sello Caja : 415495
Tipo Sello Caja : RA
Color Caja : ROTO SEAL AZUL
Adhesivo Laboratorio : LEB243395

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI
Prueba De Fuga Carga Total : 0
PREDIO
Reconexion No Autorizada : SI

PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : verificador
Numero Patrón Utilizado : 3926
Medidor : electronico
PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)
% Error : 2.06
Conforme : SI
PRUEBA REGISTRADOR
E Dosificada (Kwh) : 10
E Registrador (Kwh) : 10
Corriente (A) : 38
% Error : 0.45
Conforme : SI
PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)
Corriente (A) : 0.06
Con Fase 1 : SI
Conforme : SI


CONEXION EN BORNES

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA
Acometida Ubicación : EXTERNA
Longitud (M) : 20
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI
Al : SI
Calibre (Awg) : 6
Red De Distribución : TRENZADA
Conexión En Bornes Conforme : SI
Inspección Visual Conforme : SI
Acometida Totalmente Visible : SI
Inspección Técnica Conforme : SI
Corriente Medida en Poste
Fase 1 : 3.1
Neutro : 3.1
Corriente Medida en Bornes
Fase 1 : 3.1
Neutro : 3.1
Diferencia Corrientes
Fase 1 : 0.0
Neutro : 0.0
Linea Directa : SI
Corriente (A)
Fase 1 : 12.4
Fase 2 : 0.0
Fase 3 : 0.0
Tension (V)
Fase 1 : 119
Fase 2 : 0.0
Fase 3 : 0.0
Potencia (w)
Fase 1 : 1475.6
Fase 2 : 0.0
Fase 3 : 0.0

Se Corrige Anomalía : SI

Diagrama Conexión

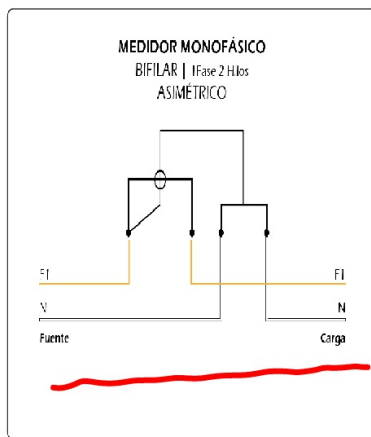

GEOREFERENCIACION

DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8044038,-78.7727137

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8044158,-78.7729379

AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : NO

Tipo Uso Mixto : NO

TOTAL AFORO

Total Aforo : 0.0

ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : NO

Predio Con Medidor : SI

Altura Medidor (M) : 1.8

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Sello 1 Tapa Bornera : 1743003

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 492088

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

NORMALIZACION ACOMETIDA

Normalización Acometida : SI

Instalo : NO

Retiro : SI

Cable Retirado Se Deja Con Usuario : NO

Observaciones Generales De Acta De Revisión : se
retira linea directa. acometida reposa en bodega
de mec, se normaliza comunicación. se corrige
anomalía, usuario se niega a firmar

Nuevo Sticker : 326578

PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$: 0.0

FINALIZACION

Hora De Finalización : 21-06-2019 15:51:05

TESTIGO

Nombre : hector fabio diaz

Cedula : 87940923

Lugar De Expedición : tumaco

Firma

TECNICO

Nombre : DIEGO VICENTE TOBAR LOPEZ

Cedula : 87218132

Lugar De Expedición : ipiales

Firma
