

DATOS ODT

Nro Orden : 6950512
Numero Acta : 73821
Código Interno : 379090
Revisión Previa : SI
INICIO ORDEN TRABAJO
Fecha Ejecución : 25-06-2019 10:58:14

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA
Nombre Suscriptor : MEDARDO QUINONEZ GUERRERO
Dirección : 0 HERRERA CS 18 - OLAYA HERRERA - TUMACO
Municipio : TUMACO
Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA
Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL
Tipo De Uso Corresponde : SI
Que Funciona Actualmente? : vivienda

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI
No. Medidor : 54476
Marca : MEC
Año : 2014
Tipo : MC-1Z
Clase : 1
Lectura Activa (kWh) : 4710.45
Tipo Medidor : MONOFASICO
Tensión : 120
Corriente : 5-100
Medida Centralizada : SI
No. Home Display : 35949
Sello Home Display : plomo
Tipo Sello Home Display : GR
Color Home Display : GRIS

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI
Prueba De Fuga Carga Parcial : 0
PREDIO
Numero De Familias Que La Integran : 1
Numero De Habitantes Vivienda : 2
MEDIDOR
Sin Sello (S) En Tapa Bornera : SI
Sin Sello 0 Sello Abierto En Caja : SI

PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA
Numero Patrón Utilizado : pz4
Medidor : electronico


PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)
Constante : 1000
Kd : SI
Corriente (Con Baja Carga) : 4.8
Tensión (V) : 116
Minutos : 0
Segundos : 31
Numero De Vueltas : 5
% Error : 4.28253615
Conforme : SI
PRUEBA REGISTRADOR
E Dosificada (Kwh) : 0.110
E Registrador (Kwh) : 0.11
Corriente (A) : 4.8
% Error : 0.90
Conforme : SI
PRUEBA DE ARRANQUE ($I < 0.1A$)
Corriente (A) : 0.06
Con Fase 1 : SI
Conforme : SI

CONEXION EN BORNES

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA
Acometida Ubicación : EXTERNA
Longitud (M) : 16
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI
Al : SI
Calibre (Awg) : 6
Red De Distribución : TRENZADA
Conexión En Bornes Conforme : SI
Inspección Visual Conforme : SI
Acometida Totalmente Visible : SI
Inspección Técnica Conforme : SI
Corriente Medida en Poste
Fase 1 : 2.2
Neutro : 2.2
Corriente Medida en Bornes
Fase 1 : 2.2
Neutro : 2.2
Diferencia Corrientes
Fase 1 : 0.0
Neutro : 0.0

Diagrama Conexión

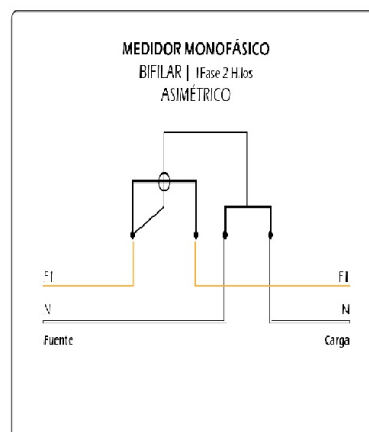

GEOREFERENCIACION

DEL TRANSFORMADOR
Georeferencia Usuario : 1.8047639,-78.7767653

AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI
Tipo Uso Mixto : NO
BOMBILLA AHORRADORA
Bombilla Ahorradora : SI
Cantidad : 3
Carga Unitaria : 20
carga Total : 60.0
Residencial : 60
No Residencial : 0
Carga Directa Fuera de Medida : 0
NEVERA
Nevera : SI
Cantidad : 1
Carga Unitaria : 400
carga Total : 400.0
Residencial : 400
No Residencial : 0
Carga Directa Fuera de Medida : 0
TELEVISOR
Televisor : SI
Cantidad : 1
Carga Unitaria : 150
carga Total : 150.0
Residencial : 150
No Residencial : 0
Carga Directa Fuera de Medida : 0
OTRO 1
Otro 1 : SI
Cual : electro bomba
Cantidad : 1
Carga Unitaria : 375
carga Total : 375.0
Residencial : 375
No Residencial : 0
Carga Directa Fuera de Medida : 0
TOTAL AFORO
Total Aforo : 985.0
Estufa A Gas : SI
Calentador A Gas : NO
Cilindro Con Gas : SI
Gas Domiciliario : NO

ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

NORMALIZACION MEDIDOR
Normalización Medidor : SI
Instalo : NO
Predio Con Medidor : SI
Reubico : NO
Exteriorizo : NO
Parametrizó : SI
Instalación Sellos : SI
Inspección Estado Del Predio : SI
DATOS MEDIDOR INSTALADO
Sello 1 Tapa Bornera : 1743011


Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL
Tipo 1 : DA
Sello Caja : 492218
Color Caja : ROTOSEAL AZUL
Tipo Caja : RA
NORMALIZACION ACOMETIDA
Normalización Acometida : NO
Tensión Toma Corriente (V) : 116
Observaciones Generales De Acta De Revisión : no
se encontró posible animalia. equipo de medida en
buen estado
Nuevo Sticker : 326655

PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A E.S.P.

El Valor Total De \$: 0.0

FINALIZACION

Usuario Estuvo Presente En La : SI
Usuario Se Negó A Firmar : SI
Hora De Finalización : 25-06-2019 10:57:27
TESTIGO
Nombre : gustavo marquinez
Cedula : 1087113226
Lugar De Expedición : tumaco
Firma



TECNICO
Nombre : Edwin Castillo
Cedula : 87942605
Lugar De Expedición : tumaco
Asociado : MEC 270.2019
Firma

